

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020
ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 01 DE 03

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	75,801,317.32	75,801,317.33	19,383,667.39	56,417,649.94								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	48,649,354.36	48,649,354.28	10,824,612.67	37,824,741.61								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	10,800,000.00	10,800,000.00	2,628,332.01	8,171,667.99								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	6,800,000.00	6,102,888.16	1,686,474.60	4,416,413.56								
CM04-1	TRABAJOS DE RESTAURACION DE TECHUMBRE DE EDIFICIO MUNICIPAL (ANTES HOTEL GRANADA) COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		957,292.31	807,678.34	149,613.97	84	84	720.1	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
CM04-2	TRABAJOS DE REMODELACION DE CABILDO Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		1,098,449.57	878,796.26	219,653.31	80	80	242.04	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,000,000.00	2,000,000.00	75,017.57	1,924,982.43								
SP01-01	SERVICIOS DE DISEÑO CONCEPTUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UNA PLAZA COMERCIAL DENOMINADA "PLAZA DE ANTOJOS" EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		75,017.57	75,017.57	-	100	100	1	servicio	Com. Gral	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	0.00	2,697,111.84	866,839.84	1,830,272.00								
ID02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO PARA ADECUACION DE DE CANCHA DE FUTBOL 7 A CANCHA DE FULBOL PROFESIONAL, EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,164,615.05	614,297.14	1,550,317.91	28	50	1825	m²	2587	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
ID03	ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL, PROFESIONAL EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		532,496.79	252,542.70	279,954.09	47	63	4	Luminarias	2587	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	33,749,354.36	33,749,354.28	8,196,280.66	25,553,073.62								
61401	CONSTRUCCION	1,100,000.00	4,284,335.70	1,778,698.78	2,505,636.92								
OP01	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE ANDADOR 1, COLONIA ENCINOS		1,158.84	1,158.84	-								
OP02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA PEDRO GONZALEZ, COLONIA VIRREYES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,303,068.19	1,284,692.73	1,018,375.46								
OP03	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASES DE POSTES DE ALUMBRADO, EN BLVD. EL GRECO		3,364.20	3,364.20	-	100	100	1.5	m³	25	personas	Municipal	Admón. Dir.

ISAF-806974b6-c693-9fff-9cc8-5e377271c24a

8/10/2020 9:06:18 AM

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 02 DE 03

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
OP05	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASES DE POSTES PARA CAMARAS EN GARITA MARIPOSA		4,410.72	4,410.72	-	100	100	2	m³	1410	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP06	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE NOGALES SONORA.		881,267.57	438,376.33	442,891.24	75	75	708	m²	Com. Gral	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
OP07	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA POSTES EN CALLE LAS TORRES, COLONIA BELLOTAS (ATRÁS ANTIGUO CERESO)		3,364.20	3,364.20	-	100	100	1.5	m³	11188	personas	Municipal	Admón. Dir.
CM08	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN CLINICA INTEGRAL DE LA MUJER		43,331.76	43,331.76	-	100	100	21	m³	5821	personas	Municipal	Admón. Dir.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	12,963,198.24	9,778,862.46	-	9,778,862.46								
SE03-1	PINTURA TERMOPLASTICA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD COLONIA CENTRO					30	30	739.15	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416	CECOP	1,404,075.48	1,428,309.83	-	1,428,309.83								
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	18,282,080.64	18,257,846.29	6,417,581.88	11,840,264.41								
BA01	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. ADOLFO RUIZ CORTINES (MANTENIMIENTO URGENTE), EN EL MUNICIPIO DE NOGALE SONORA		1,604,280.87	1,283,425.74	320,855.13	100	24	4500	m²	2600	personas	Municipal	Licitacion
BA05	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA CALIENTE EN CALLE RUIZ CORTINES, PROLONGACIÓN OBREGON, GRECO, IGNACIO A LA TORRE Y AVE. DE LOS NOGALES		140,400.00	140,400.00	-	100	100	50	m³	Com. Gral	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA06-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO EN COLONIA BENITO JUAREZ		7,712.28	7,712.28	-	100	100	3.5	m³	2577	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA07-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN FRACCIONAMIENTO BELLOTAS Y VARIOS PUNTOS		72,900.00	72,900.00	-	100	100	25	m³	11188	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA10	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO EN FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL, COLONIA SAN MIGUEL		9,980.28	9,980.28	-	100	100	4.5	m³	13773	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA10-1	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL Y VARIOS PUNTOS		72,900.00	72,900.00	-	100	100	25	m³	13773	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA12	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA COLINAS DEL YAQUI		9,594.18	9,594.18	-	100	100	4.5	m³	8085	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA20	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PROL. AVENIDA ALVARO OBREGON (MANTENIMIENTO URGENTE), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		926,890.46	926,890.46	-	100	30	3500	m²	14715	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
 Del 01 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020
 ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA


Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 03 DE 03

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA21	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALEJANDRO SILVA ENTRE CALLEJON CUAUHTEMOC Y 5 DE FEBRERO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		864,807.84	864,807.84	-	100	30	7200	m²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA22	TRABAJOS DE BACHEO CONCRETO HIDRAULICO PARA COLONIA ALAMOS		148,872.60	148,872.60	-	100	100	23.5	m³	1372	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA23	BACHEO CON EMULSION DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (JETPATCHER)		253,344.00	253,344.00	-	100	100	8000	LTS	Com. Gral	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA24	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA TERRAZAS		151,347.96	151,347.96	-	100	100	15	m³	13386	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA26	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		2,532,085.29	2,025,668.24	506,417.05	100	48	18907.86	m²	4196	personas	Municipal	Licitacion simplificada
BA27	TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE TECNOLOGICO, ENTRE AVE. TECNOLOGICO Y CONJUNTO JARDIN		3,364.20	3,364.20	-	100	100	1.5	m³	3770	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA29	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO AISLADO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA INTERNACIONAL (CARRIL DERECHO) ENTRADA A NOGALES EN LA CIUDAD DE NOGALES SONORA		433,160.30	433,160.30	-	100	100	3745	m²	Com. Gral	personas	Fopin	Cont. Adj. Dir.
BA31	TRABAJOS DE BACHEO EN ACCESO A REAL DEL ARCO		19,699.20	9,849.60	9,849.60	100	100	4	m³	4929	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA32	TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE OLIVOS		3,364.20	3,364.20	-	100	100	1.5	m³	710	personas	Municipal	Admón. Dir.
625	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,100,000.00	4,100,000.00	-	4,100,000.00								
62513	SEMAFORIZACION	4,100,000.00	4,100,000.00	-	4,100,000.00								

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

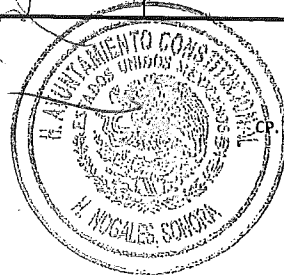

CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
 TESORERO
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JAIQUELBA QUIÑONES
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

HOJA: 01 DE 02

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	27,151,962.96	27,151,963.05	8,559,054.72	18,592,908.33								
6200	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	27,151,962.96	27,151,963.05	8,559,054.72	18,592,908.33								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,908,712.56	10,908,712.56	938,284.35	9,970,428.21								
62401	CONSTRUCCION	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00								
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	2,335,097.40	2,335,097.40	0.00	2,335,097.40								
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	5,542,102.92	5,542,102.92	0.00	5,542,102.92								
62410	ELECTRIFICACIÓN URBANA	2,131,512.24	2,131,512.24	938,284.35	1,193,227.89								
EL10	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS FRESNOS PARA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD EN CLINICA INTEGRAL DE LA MUJER		462,055.77	462,055.77	0.00	100	100	270	ml	40	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
EL11	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS TEPECANOS ENTRE CALLE LAS ACHITAS Y LOS TEPECANOS FINAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		321,886.59	316,905.47	4,981.12	100	100	119	ml	30	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.
EL12	ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL FRESNO, ENTRE CALLE PALO VERDE Y LA PALMA, COLONIA LOS ALAMOS, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA		236,112.73	159,323.11	76,789.62	67	67	220	ml	20	Personas	FISM	Cont. Adj. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
 Del 01 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020
 ANEXO 12


MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
 Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

HOJA: 02 DE 02

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
625 62503	EDIFICACION NO HABITACIONAL CONSTRUCCION	16,243,250.40	16,243,250.49	7,620,770.37	8,622,480.12								
PA08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS PAPAGOS, ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE OTOPAMES, COLONIA EL RASTRO, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		6,796,235.48	5,724,966.42	1,071,269.06	90	90	2733.3	m ²	225	Personas	FISM	Lic. Publica
PA09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL FESNO TRAMO I Y CALLE DE LAS PALMAS, COLONIA ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA		2,458,687.48	1,895,803.95	562,883.53	90	80	545.46	m ²	20	Personas	FISM	Lic. Simplificada
PA10	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL MANUEL DOBLADO TRAMO II (ENTRE MUNICIPIO DE BACANORA Y ORIZABA) COLONIA LEANDRO VALLE, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA												

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
 TESORERO
 FIRMA Y SELLO

ING. JUAN DE PALMA QUIJONES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA: 01 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
61418	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES		
BA24	TRABAJOS DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA TERRAZAS	EN COLONIA TERRAZAS	SE HIZO REGISTRO POR UN CARGO DE \$13,232.16 EN LA PARTIDA 61401-CM08-1, DEBIENDO SER LA CORRECTA, EN LA 61418-BA24
BA31	TRABAJOS DE BACHEO EN ACCESO A REAL DEL ARCO	COLONIA UNIDAD DEPORTIVA	SE HIZO REGISTRO POR UN CARGO DE \$9,849.60 EN LA PARTIDA 61401-CM08-1, DEBIENDO SER LA CORRECTA, EN LA 61418-BA31
BA32	TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE OLIVOS	COLONIA LOS OLIVOS	SE HIZO REGISTRO POR UN CARGO DE \$3,364.20 EN LA PARTIDA 61401-CM08-1, DEBIENDO SER LA CORRECTA, EN LA 61418-BA32
BA32	FRACCIONAMIENTO OLIVOS	COLONIA LOS OLIVOS	
